

# Orientering pågående byggeprosjekter

Narvik kommunestyre 01.10.2020



NARVIK  
KOMMUNE

# Prosjektfase oversikt

1. Ny Brannstasjon – Teknologibyen
2. Nytt Helsehus Furumoen
3. Nye Narvik ungdomsskole



OFOTEN BRANN  
OG REDNING

(9-14)

# Ny Brannstasjon - Teknologibyen

## Tid:

- Entreprenøren har fått utsatt overlevering og ny omforent ferdigstillelsesdato 16.november.2021.

## Kost:

- Vedtatt i BST 069/19 – samlet kostnad 211 MNOK eks mva. Dette inkluderer tilpasninger Teknologiveien 2A og 19 og utbedring av kryss/veg iht rekkefølgebestemmelser. Prognosen tilsier at vi havner innenfor budsjett.

## Kvalitet:

- Ny brannstasjon over 3.etasjer på ca 3757 kvm.
- Tilpasninger TV2A, 19 og utbedring kryss/veg.

## Pågående arbeider:

- Detaljprosjektering av brannstasjon pågår
- Grunnarbeider pågår
- Anskaffelse av rådgiver til prosjektering av arbeider på vei/kryss pågår
- Tilpasninger Teknologiveien 2A og 19



# Nytt Helsehus Furumoen

## Tid:

- Ferdigstillelser 2.kvartal.2024.

## Kost:

- Kostnadsramme 392,2 MNOK inkl mva. Prognoser tilsier at vi havner innenfor budsjett.

## Kvalitet:

- Nytt helsehus over 4 etasjer på ca 6825 kvm

## Pågående arbeider:

- Kontraktsignering med Hent AS er gjennomført inneværende uke
- Klargjøring av sykehus/helsehus tomt
- Etablering av felles byggherreorganisasjon med UNN/sykehusbygg
- Detaljprosjektering av sykehus/helsehus



# Nye Narvik ungdomsskole

## Tid:

- Skolen ferdigstilt 02.06.2020
- Flerbrukshall, turnhall 12.10.2020
- Utomhus 12.10.2020

## Kost:

- Kostnadsramme: 486 MNOK, låneopptak 371 MNOK. Prognoser tilsier at vi havner 3-4 mill over budsjett, til tross for at innredning, IKT-utstyr og kunst er vedtatt løst innenfor eksisterende rammer.

## Kvalitet:

- Ny ungdomsskole over 3 etasjer totalt 8 732 m2
- Ny Flerbrukshall 4 377 m2
- Ny turnhall 2 477 m2
- Totalt areal 15 581 m2

## Pågående arbeider:

- Oppfølging av bygging turn og flerbrukshall, forberedelse til overtakelse
- Ferdigstillelse av utomhus området
- Utkvittering av feil og mangler ved skolebygg

# Skolen sett fra Bjørnsons vei



# Skolegården sett mot øst



# Skolegården sett mot vest



# Skolegården sett mor syd



# Gang og sykkelvei




# Sykkelparkering og lærerparkering



# Sykkelparkering under tak



# Kantine og aula

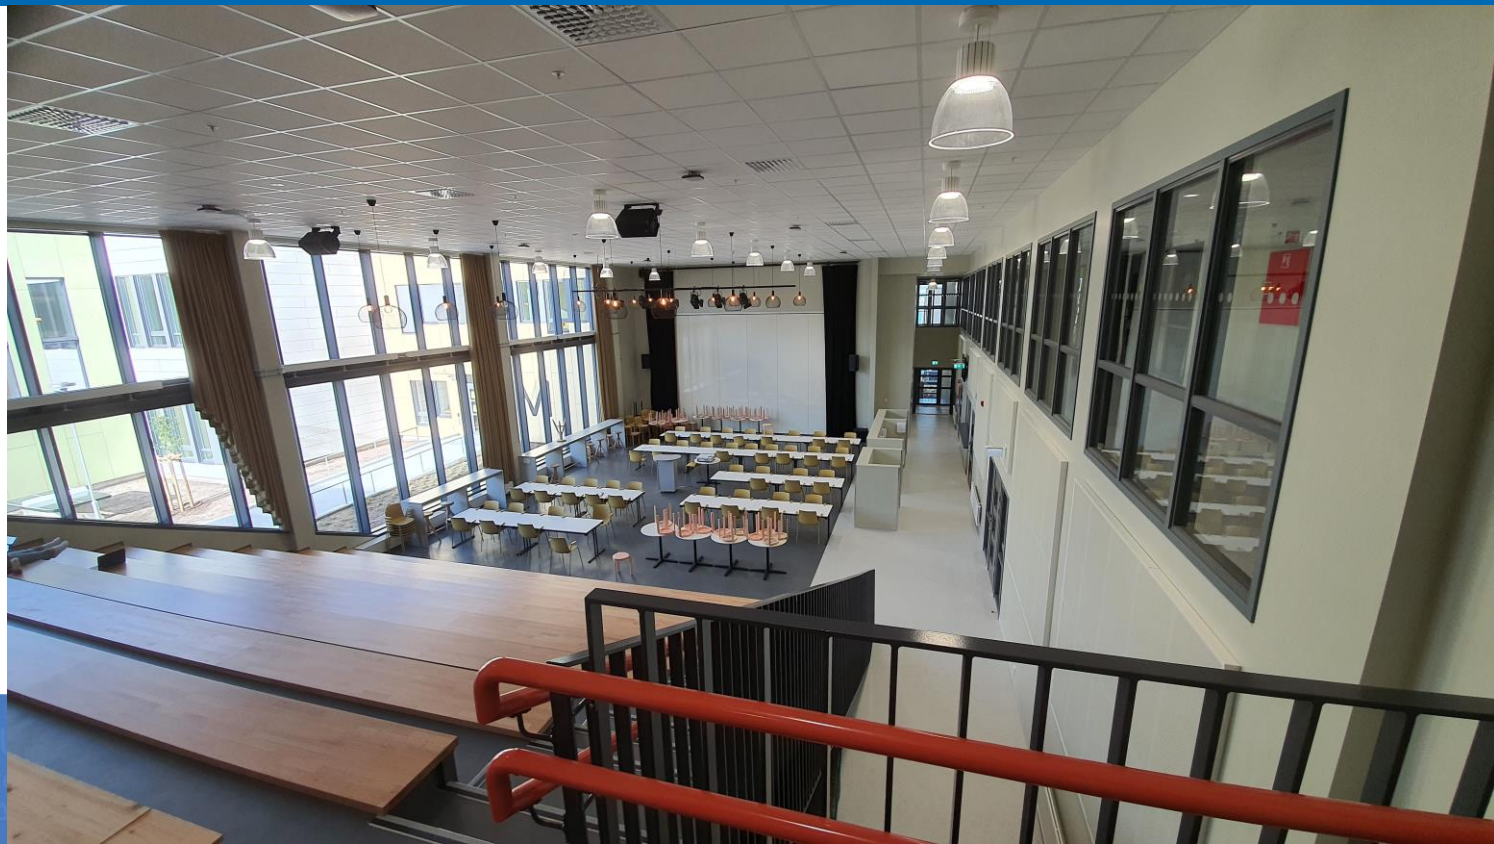


NARVIK  
KOMMUNE

# Utsmykning av trapperom



VM april 2023  
Kultur, Utvikling, Vann, avløp, renovasjon og felingsstøtt  
Eldreomsorg, Skole, Parkerings  
Veg- og park, Skole, Parkerings

# Lærerarbeidsrom, et av i alt 9 stk.

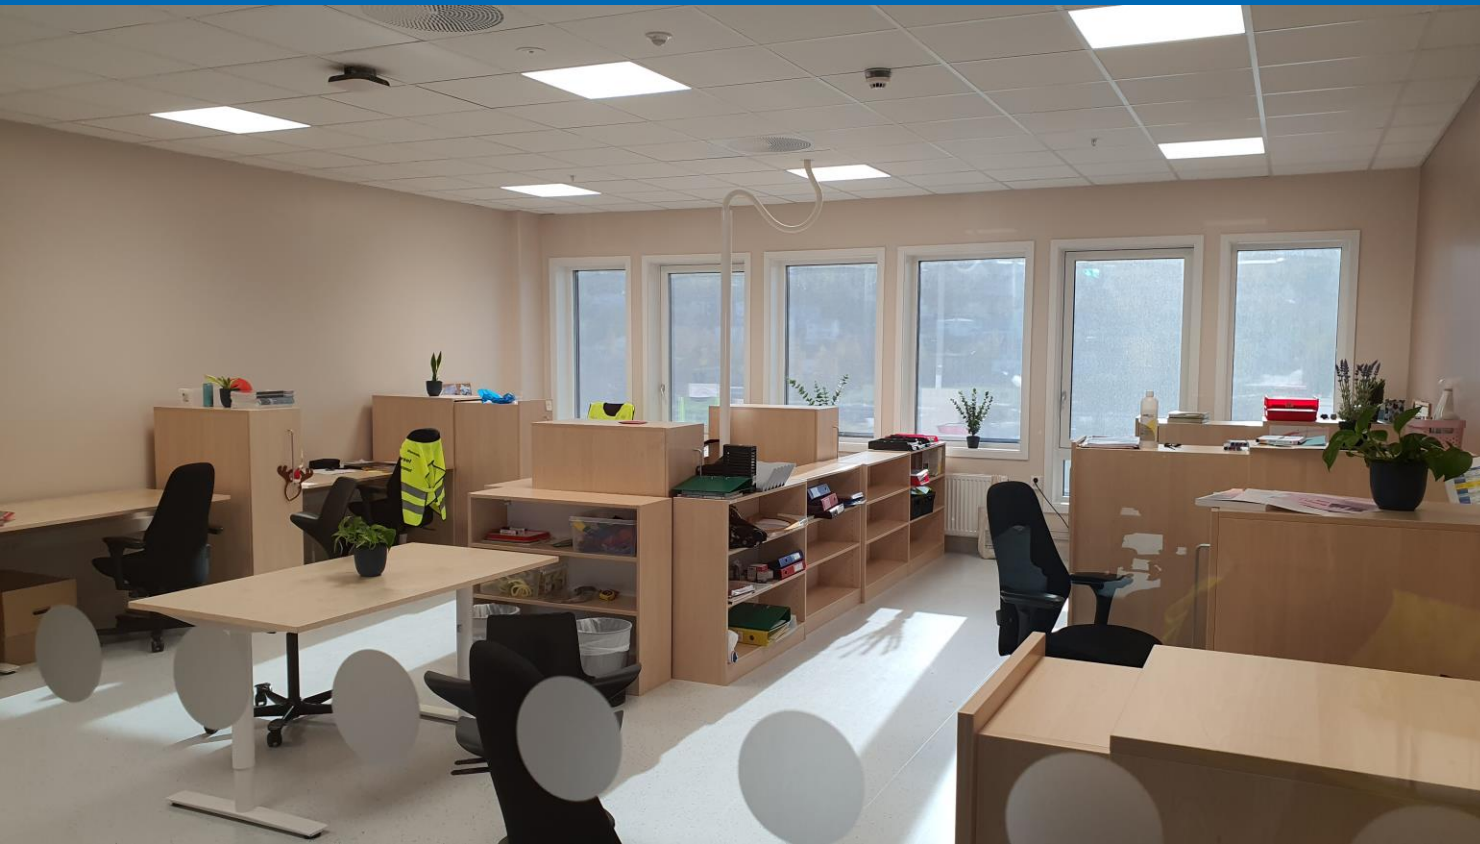

# Elevgarderobe




# Flerbrukshall, oppmerking pågår




# Turnhall



# Haller sett fra tribune

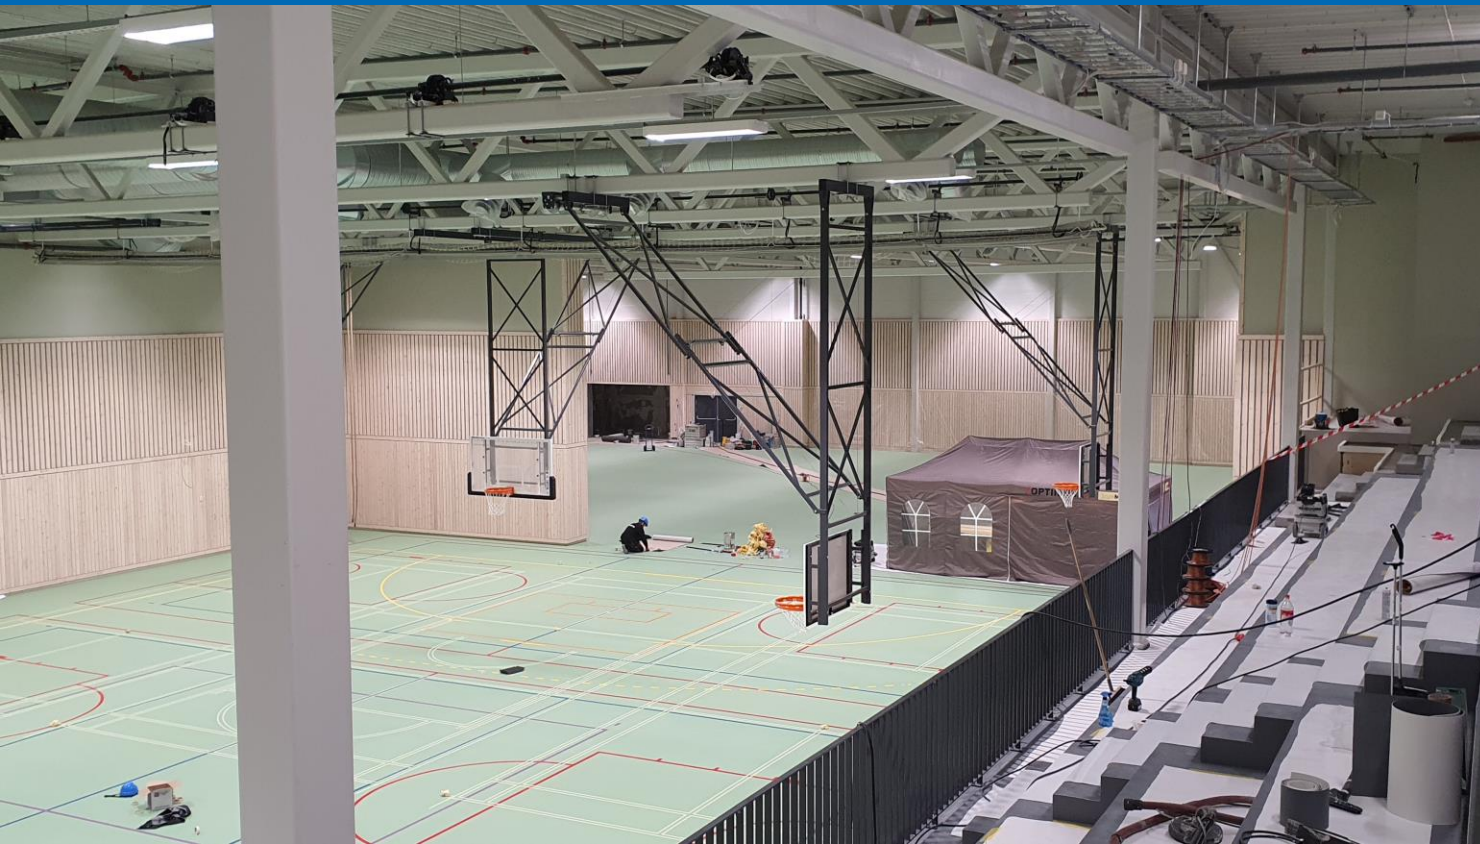

# Takk for oppmerksomheten

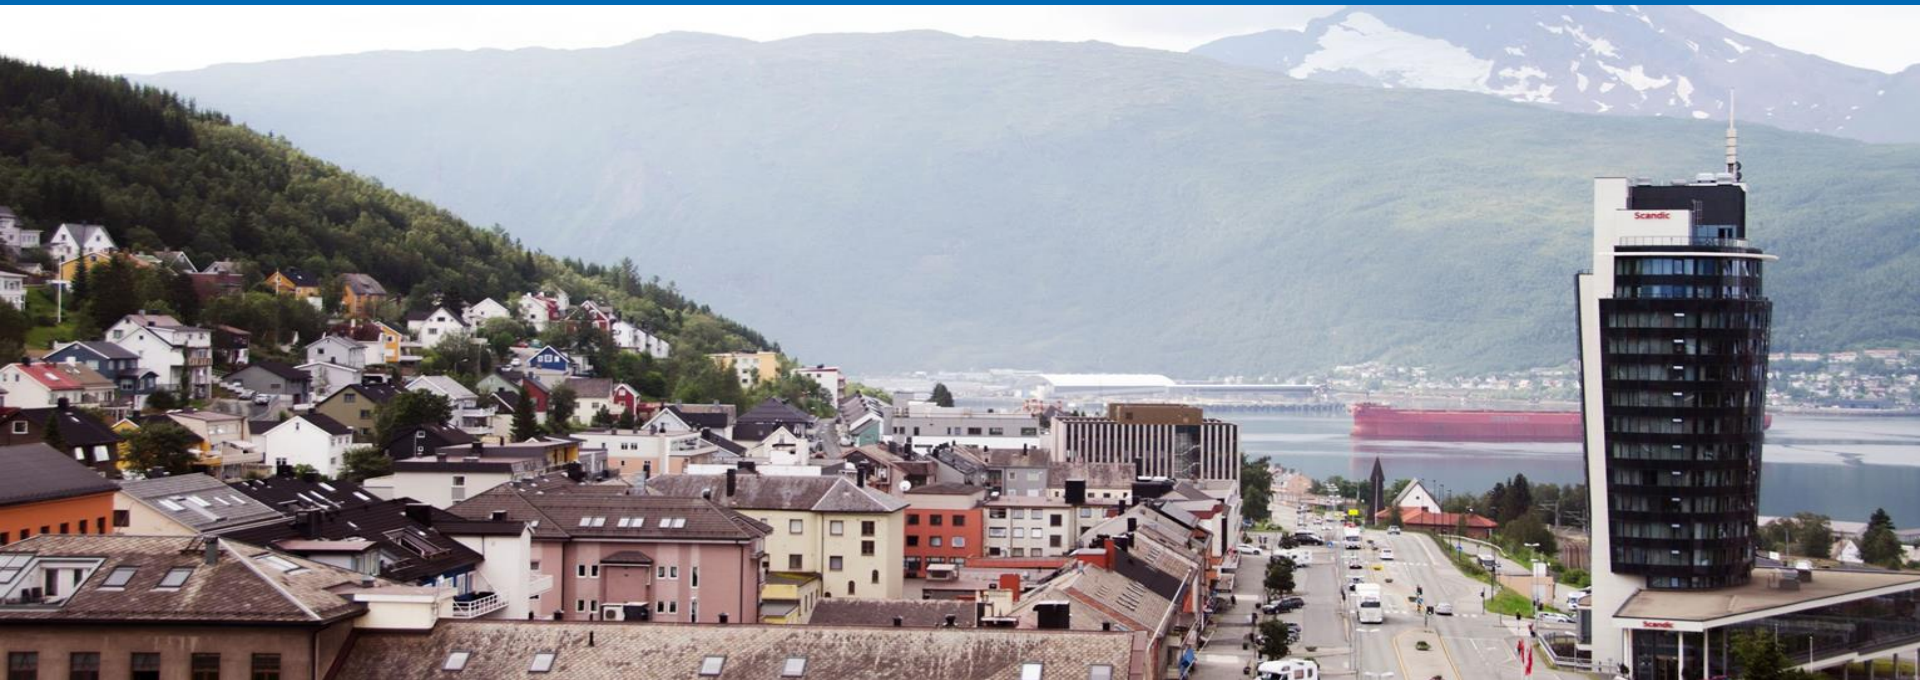

Samfunnssikkerhet og beredskap  
#Ungdom Miljø Helse  
Nytenkende Barn og familie  
Ansatte Eldreomsorg  
pyskisk helse  
Seniortilbud  
Utdanning  
Barnehage Eldreomsorg  
Kultur  
Utvikling  
Vann, avløp, renn  
Eldreomsorg  
Skatt og næring  
Veg- og park  
Skole  
Parkerings  
VM albert 2023

[www.narvik.kommune.no](http://www.narvik.kommune.no)



NARVIK  
KOMMUNE
